



Valdresveien 13, 2900 Fagernes
Tlf 911 66 407

Termografikontroll
for
BRUFLAT KIRKE

Utført av : Arne Håvard Tronsplass
Kjentmann:

Dato: 6.03.2017

Termografikkontroll for:
BRUFLAT KIRKE



Rapporten inneholder:


- Dokumentasjon over avvik funnet under inspeksjonen.
- Innholdsfortegnelse over avvik funnet under inspeksjonen
- Oversikt over termograferte anlegg

Oversikt over feilkategorier:

- **Kategori 0 = Intet avvik:** - ikke behov for noe tiltak.
- **Kategori 1 = Mindre avvik** - overvåkes, ny kontroll avtales
- **Kategori 2 = Viktig avvik registrert** - utbedres snarest mulig
- **Kategori 3 = Alvorlig avvik** - omgående utbedring nødvendig

Arne Håvard Tronsplass

Kunde	BRUFLAT KIRKE
Oppdragsadresse	,
Kontaktperson/kjentmann	
Kamera type	NEC 7800
Kalibreringsdato	13.03.2016
Termografør	Arne Håvard Tronsplass

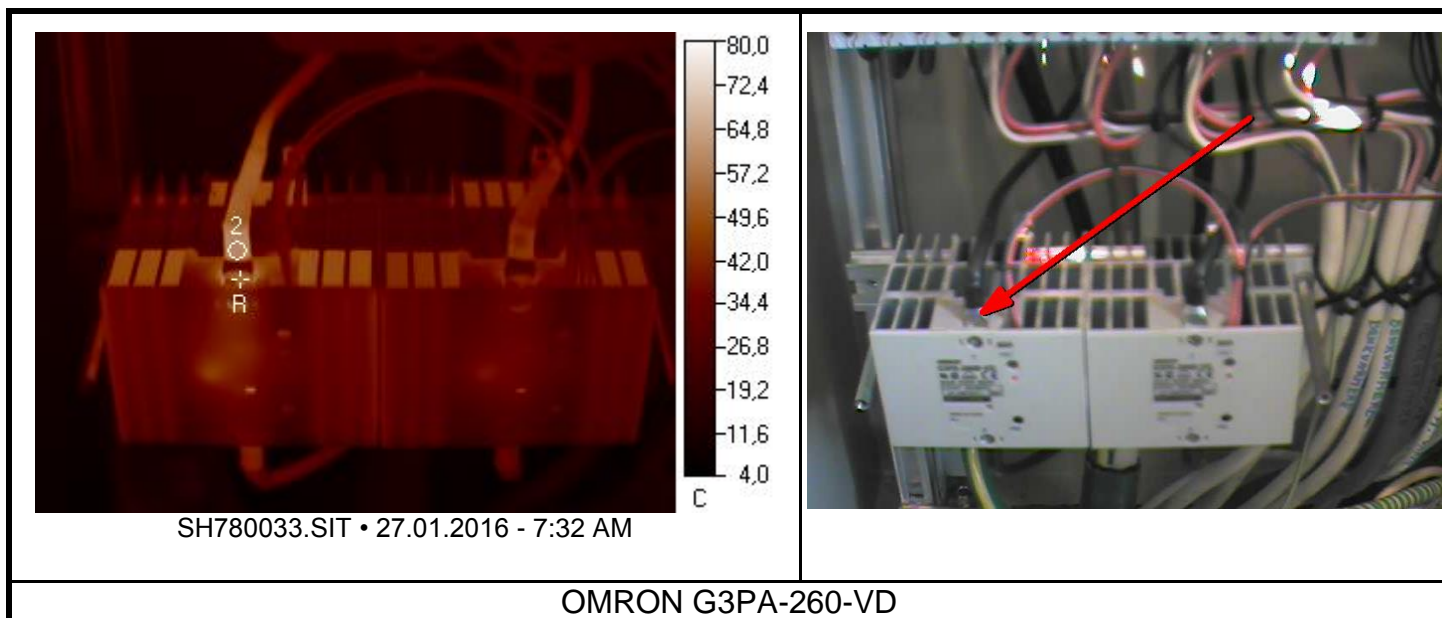

	Ref.	Punkt 2
Emiss.	0,98	0,98
Belastning		
Normaltemp.		
Max målt temp.	54,1 C	59,4 C
Overtemperatur		5,3 C

Utstyr	OMRON G3PA-260B-VD
Sted	Fordelingsskap
Forhold	
Antatt feil	Varmgang i kabelsko
Feilkategori	1
Kommentar	Kabelsko byttes ved anledning
Forslag til utbedring	Bytte kabelsko

Utbedret av:	
--------------	--



Termografikontroll for:
BRUFLAT KIRKE

Innholdsfortegnelse
BRUFLAT KIRKE

Bilde	Dato / Tid	Utdstyr Id	Sted	Side
SH780033.SIT	27.01.16 7:32 AM	G3PA-260B-VD	FORDELINGSSKAP	2
