



Valdresvegen 13, 2900 Fagernes
Tlf 911 66 407

Termografikontroll
for
NORD ETNEDAL KIRKE

Utført av : Arne Håvard Tronsplass
Kjentmann:

Dato: 6.03.2017

Termografikkontroll for:
NORD ETNEDAL KIRKE



Rapporten inneholder:


- Dokumentasjon over avvik funnet under inspeksjonen.
- Innholdsfortegnelse over avvik funnet under inspeksjonen
- Oversikt over termograferte anlegg

Oversikt over feilkategorier:

- **Kategori 0 = Intet avvik:** - ikke behov for noe tiltak.
- **Kategori 1 = Mindre avvik** - overvåkes, ny kontroll avtales
- **Kategori 2 = Viktig avvik registrert** - utbedres snarest mulig
- **Kategori 3 = Alvorlig avvik** - omgående utbedring nødvendig

Arne Håvard Tronsplass

Kunde	NORD ETNEDAL KIRKE
Oppdragsadresse	,
Kontaktperson/kjentmann	
Kamera type	NEC 7800
Kalibreringsdato	13.03.2016
Termografør	Arne Håvard Tronsplass

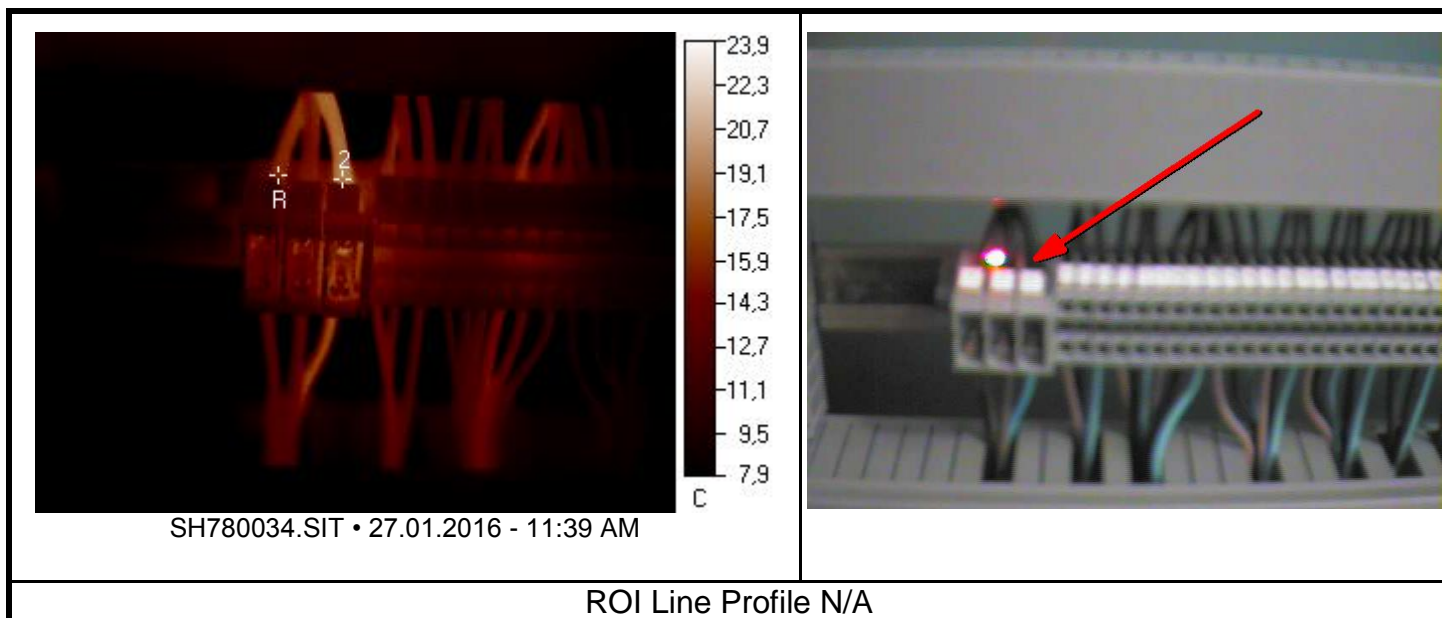

	Ref.	Point2
Emiss.	0,98	0,98
Belastning		
Normaltemp.		
Max målt temp.	15,8 C	19,0 C
Overtemperatur		3,2 C

Utstyr	Rekkeklemme
Sted	Fordelingsskap
Forhold	
Antatt feil	Løs tilkobling
Feilkategori	2
Kommentar	Løs tilkobling
Forslag til utbedring	Utbedret

Utbedret av: Arne Håvard Tronsplass Valdres Installasjon AS	
---	--



Termografikkontroll for:
NORD ETNEDAL KIRKE

Innholdsfortegnelse
NORD ETNEDAL KIRKE

Bilde	Dato / Tid	Utdstyr Id	Sted	Side
SH780034.SIT	27.01.16 11:39 AM	REKKEKLEMME	FORDELINGSSKAP	2
